


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	02/11/2020	03/11/2020	1
2	B	Approntamento aree di cantiere	03/11/2020	07/11/2020	4
3	C.1	Esecuzione accessi alle aree cantiere	07/11/2020	08/11/2020	1
4	C.2	lavori di demolizione e consolidamento	08/11/2020	23/12/2020	45
5	C.3	Rimozione intonaci	23/12/2020	07/01/2021	15
6	C.4	Realizzazione impianti	07/01/2021	27/01/2021	20
7	C.5	Posa di nuovi intonaci	27/01/2021	16/02/2021	20
8	C.6	Consolidamento superfici lapidee	16/02/2021	01/03/2021	13
9	C.7	Pavimentazioni	01/03/2021	31/03/2021	30
10	C.8	Collazione infissi	31/03/2021	10/04/2021	10
11	C.9	Esecuzione opere di finitura e rivestimenti vari	10/04/2021	05/05/2021	25
12	C.10	Tinteggiatura interna	05/05/2021	25/05/2021	20
13	D	Opere di ripristino luoghi e smobilizzo aree cantieri	25/05/2021	30/05/2021	5
14	E	Fine lavori	30/05/2021	31/05/2021	1

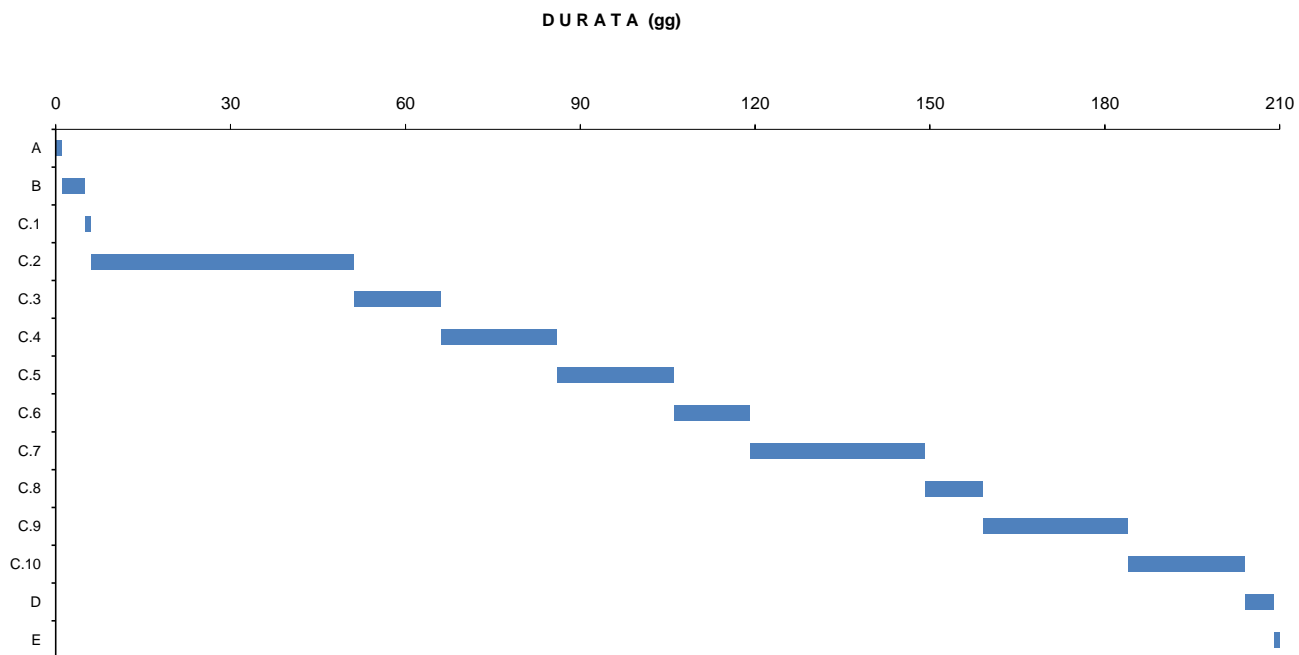

Inizio dei lavori

Fine lavori

TC

210

gg.

naturali consecutivi
